




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
UNITA' SPECIALE DEI SERVIZI TECNICI

**Lavori di sostituzione degli impianti elevatori di
 "Palazzo Mariani"**

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

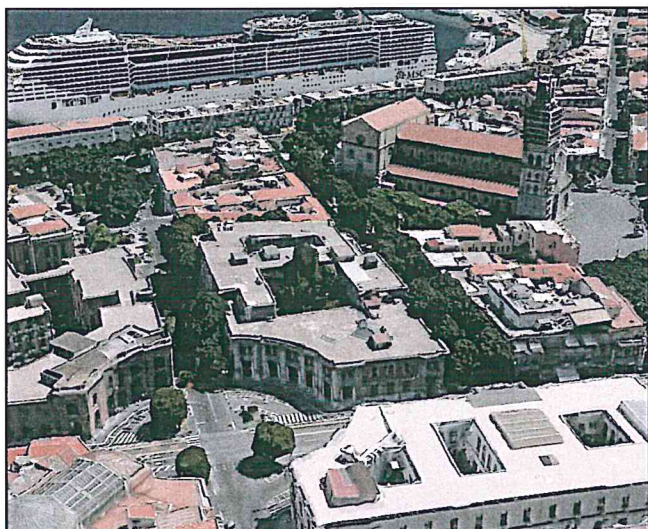

DISCIPLINA:

ELABORATI ECONOMICI

ELABORATO:

Cronoprogramma

TAVOLA:

UNICA

COD. PROGETTO:

NOME FILE:

SCALA:

DATA:

Novembre 2016

I PROGETTISTI:

Ing. Giovanni LUPO

REVISIONE:	DATA:	RIFERIMENTO REVISIONE:	ESEGUITO:	CONTROLLATO:	APPROVATO:
01	16/10/2017				

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Biagio La Spada

CRONOPROGRAMMA
Sostituzione di tre impianti elevatori presso Palazzo Mariani

FASE / TEMPI	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				TOTALE	
	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9	Settimana 10	Settimana 11	Settimana 12	Settimana 13	Settimana 14	Settimana 15	Settimana 16		
	giorni	giorni	giorni	giorni	giorni	giorni	giorni	giorni	giorni	giorni	giorni	giorni	giorni	giorni	giorni	giorni		
Ricognizione dei luoghi e allestimento cantiere	4																4	12
Opere edili parapetti			2	2	2	2											8	
Realizzazione di opere provvisionali dell'Impianto Elevatore 1	3	2															5	35
Opere edili dell'Impianto Elevatore 1		4	2														6	
Dismissione dell'Impianto Elevatore 1		1	3														4	
Smaltimento rifiuti			1														1	
Installazione guide ed arcate Impianto elevatore 1			1	4													5	
Relaizzazione dell'impianto elettrico a servizio dell'Impianto elevatore 1				3													3	
Assemblaggio e montaggio cabina dell'Impianto Elevatore 1					7	2											9	
Prove di funzionamento Impianto Elevatore 1						2											2	
Realizzazione di opere provvisionali dell'Impianto Elevatore 2						3	2										5	35
Opere edili dell'Impianto Elevatore 2							4	2									6	
Dismissione dell'Impianto Elevatore 2							1	3									4	
Smaltimento rifiuti								1									1	
Installazione guide ed arcate Impianto elevatore 2								1	4								5	
Relaizzazione dell'impianto elettrico a servizio dell'Impianto elevatore 2									3								3	
Assemblaggio e montaggio cabina dell'Impianto Elevatore 2										7	2						9	
Prove di funzionamento Impianto Elevatore 2											2						2	
Realizzazione di opere provvisionali dell'Impianto Elevatore 3											3	2					5	35
Opere edili dell'Impianto Elevatore 3												4	2				6	
Dismissione dell'Impianto Elevatore 3												1	3				4	
Smaltimento rifiuti													1				1	
Installazione guide ed arcate Impianto elevatore 3													1	4			5	
Relaizzazione dell'impianto elettrico a servizio dell'Impianto elevatore 3														3			3	
Assemblaggio e montaggio cabina dell'Impianto Elevatore 3															7	2	9	
Prove di funzionamento Impianto Elevatore 3																2	2	
Smobilizzo cantiere																3	3	3

120
